CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

OPERA	LAVORAZIONI	GIORNI
01	VALLO E RILEVATO PARAMASSI (8 mesi)	
	Preparazione e pulizia delle aree, rimozione delle specie arboree	20 gg
	Scavi e movimenti terra	70 gg
	Riprofilatura del versante	20 gg
	Realizzazione del rilevato in terra rinforzata	80 gg
	Realizzazione di scogliere al piede	10 gg
	Realizzazione di canalette e riprofilatura dell'impluvio	20 gg
	Finiture, sistemazioni finali, rinverdimenti	20 gg
02	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DA PARTE DEL TORRENTE CENISCHIA (7 mesi)	
	Formazione di scogliere cementate a monte dell'abitato	45 gg
	Formazione di scogliere cementate a valle dell'abitato	20 gg
	Demolizione e ricostruzione dei muretti in c.a. con installazione di nuovo parapetto e predisposizione per panconature	105 gg
	Rifacimento attraversamento in acciaio corten rimovibile e/o sollevabile	20 gg
	Nuova passerella in legno rimovibile e/o sollevabile di collegamento pedonale tra le due sponde del torrente Cenischia	20 gg
03	INSTALLAZIONE DI BARRIERA PARAMASSI IN TESTA AL RILEVATO PARAMASSI (2 mesi)	
	Cantierizzazione e preparazione delle aree	5 gg
	Formazione di ancoraggio	15 gg
	Installazione della barriera paramassi	30 gg
	Sistemazioni finali	10 gg
04	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE E CHIODATURE DEL VERSANTE (2,5 mesi)	
	Ispezione delle pareti in calata	10 gg
	Disgaggio controllato	10 gg
	Posa di reti in aderenza	30 gg
	Installazione di chiodi e ancoraggi	29 gg
05	INSTALLAZIONE DI ELEMENTI FERMANEVE PER LA LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO VALANGHE (1,5 mesi)	
	Ispezione dei versanti e tracciamento delle opere	10 gg
	Trasporto in elicottero degli elementi e degli ancoraggi	35 gg
	Formazione ancoraggi e fondazioni	15 gg
	Installazione elementi fermaneve	15 gg
	Collaudo, verifiche e sistemazioni finali	5 gg

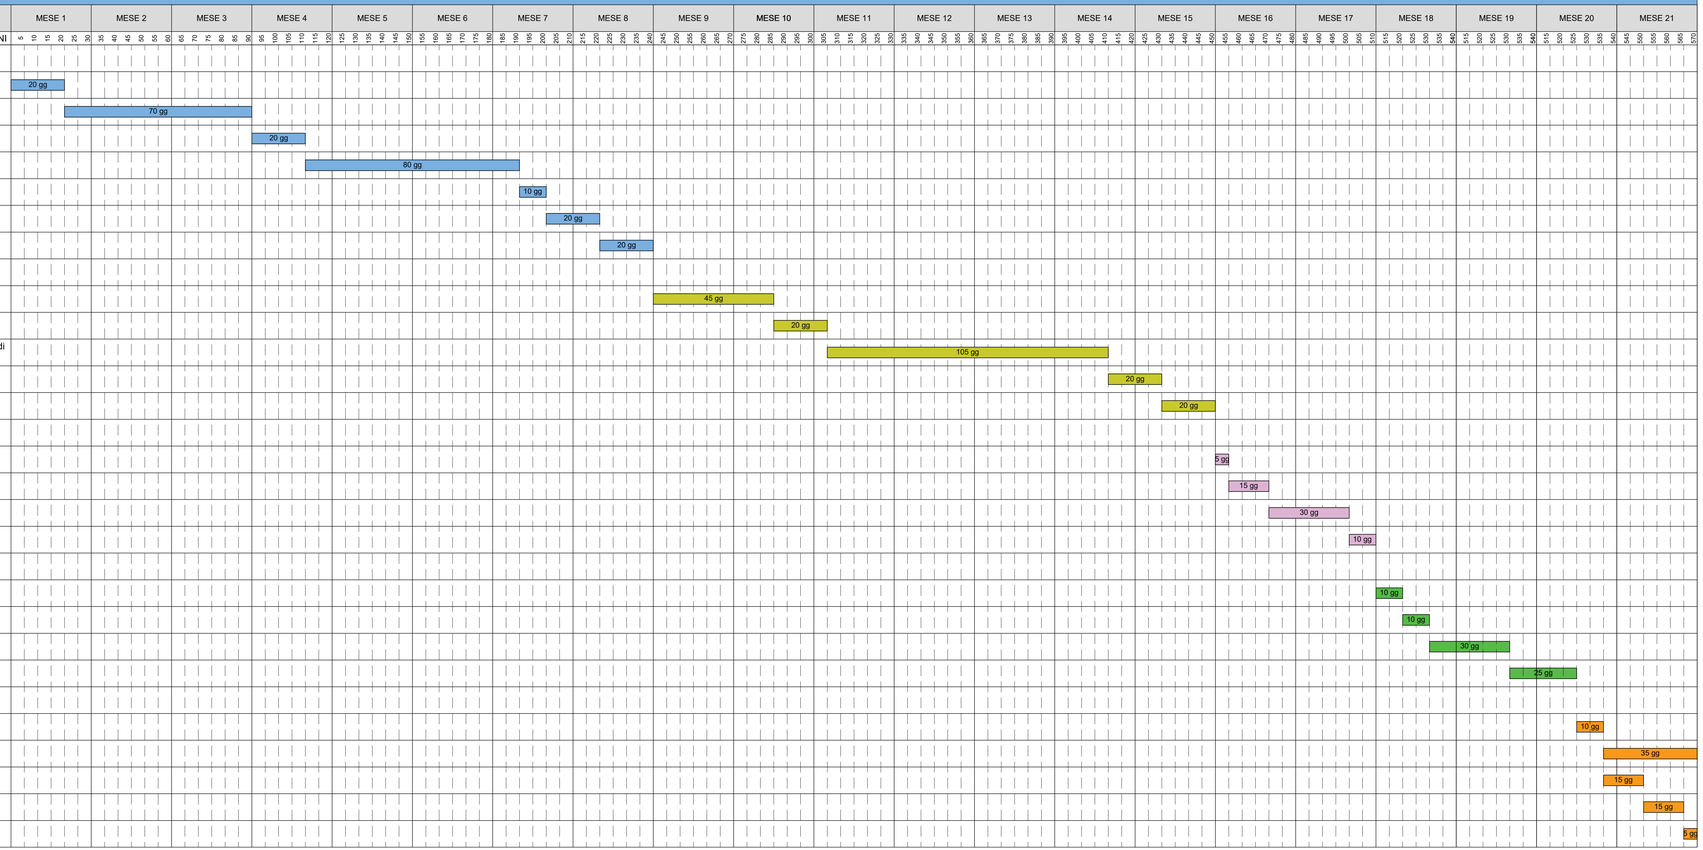

Comune di Moncenisio
Città Metropolitana di Torino
Regione Piemonte

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CENISCHIA IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI MONCENISIO

CUP: J34D24000100001 – CIG: B2E7B808D2

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

OGGETTO

01. ELABORATI DESCRITTIVI

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

TIMBRI E FIRME

SRIA s.r.l.
STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI
VIA RODOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL.: +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

ing. Luca MAGNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Posizione n.10047V

ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Posizione n.2288

ing. Santo LA FERLITA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Posizione n.10043X

CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	GIU2025
COD. LAVORO	7115R
TIPOL. LAVORO	P
LOTTO	-
STRALCIO	-
SETTORE	1
TIPOL. ELAB.	CP
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	08
VERSIONE	0

REDATTO
ing. Gianluca COLOMBO

CONTROLLATO
ing. Luca MAGNI

APPROVATO
ing. Santo LA FERLITA

ELABORATO

P-1.8

Diritti riservati ai sensi D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione
